# News Release



## <u>志賀原子力発電所の防潮堤・防潮壁の完成および</u>安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について

平成24年10月1日 北陸電力株式会社

志賀原子力発電所における津波等に対する安全強化策の「更なる対策」の1つである 防潮堤・防潮壁が完成しました。また、「更なる対策」の進捗状況を取りまとめました ので、お知らせします。

当社は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急時の「電源確保」及び「除熱機能の確保」、「発電所敷地内への浸水防止」等の観点から安全強化策を取りまとめ、そのうちの「緊急安全対策」を昨年4月までに完了し、現在、一層の信頼性向上を図るための「更なる対策」について、対策内容を検討しながら実施しております。

この度、「更なる対策」の1つである防潮堤・防潮壁が9月末に完成しました。

また、本年3月末の進捗状況の取りまとめから半年が経過したことを踏まえ、「更なる対策」の進捗状況を取りまとめました。

当社としては、引き続き、志賀原子力発電所の安全強化策を確実に実施するとともに、今後も新たな知見が得られた場合は迅速かつ的確に対策を追加し、志賀原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

以上

添付資料 1 防潮堤の完成状況

添付資料2 安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について

### 防潮堤の完成状況


#### 防潮堤の概要

長さ 約700m

高さ 4m (標高 15m)

鉄筋コンクリート製

排水ゲート 42 箇所 (41 箇所 + 大型 1 箇所)

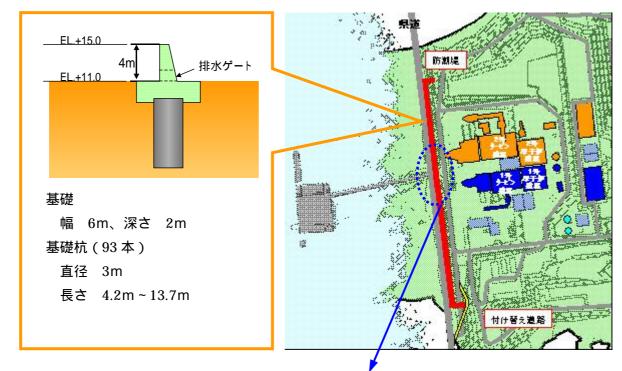



#### 安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について

平成24年9月末時点

	更 な る 対 策			
		状 況	平成 24 年度	平成 25 年度
電源 - 確保 -	非常用電源 (大容量) の配備			接続方法改善
	・大容量電源車 ( 空冷式 ) の配備	手配中		
	・必要資機材(ケーブル等)の配備		電源	車配備予定
	外部電源早期復旧による所内電源の確保	完 了	(H23年6月完了)	
	外部電源の信頼性確保			
	・すべての送電線の各号機への接続	工事中		
	・免震金具の取り付け	完 了	(H23年8月完了)	
除熱 機能 確保	浸水した原子炉補機冷却系ポンプの機能回復手段の整備			
	・原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ	完了	  (H24年3月完了)	
	の予備電動機の配備	,,,	(12: 13/3/03 /	
	水源の多様化			,
	・大坪川ダム水取水用の水中ポンプ,ホース等の配備等	完了	(H23年9月完了)	
	・復水貯蔵タンク、トレンチの耐震信頼性向上	一部完了		
	・耐震性貯水槽の追加設置	完 了	■ (8月完了	)
	原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置	完 了	(H24年3月完了)	
	<b>消防車追加配備</b> (計3台)	完 了	(H24年3月完了)	
	ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化	完 了	(7月完了)	
	配管等の耐震裕度向上			
	・消火系配管	完 了	(H24年2月完了)	
	・原子炉補機冷却系、主蒸気系等	完 了	(H24年2月完了)	
	・非常用ガス処理系配管トレンチ	完 了	■ (5月完了)	
	格納容器ペント専用電源の設置	完了	(H24年3月完了)	
その他 強化策 -	防災施設・資機材等の強化	, = -		
				ール ディかク移設等
	・緊急時対策棟の設置	工事中		運用開始予定
	・防災資機材専用倉庫の設置	工事中		
	・モニタリング設備の強化	手配中		
	・個人線量計の追加配備 , 高線量対応防護服の配備	完 了	(H23年6月完了)	
	・構内主要アクセス道路の補強	工事中		
	・復旧作業用クレーン車の常設	完了	(H23年6月完了)	
	がれき撤去用重機の配備			
	・ホイールローダの配備	完了	(H23年4月完了)	
	・ブルドーザの配備	完 了	(H23年12月完了)	
	原子炉建屋水素排出設備の設置~		<b></b>	
	・ブローアウトパネル開放機材設置		(7月完了)	
	・水素検知器設置	手配中		
$\vdash$	緊急時協力会社集合棟の設置	準備中		\A \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
敷地内への	防潮堤の構築	完了	===	進入道路整備等
	取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置	完 了		現場復旧工事等
浸水防	<b>浸水対策の強化(扉の水密化、配管貫通部の水密性強化)</b> ・海水熱交換器建屋		・防潮壁(9月完成	)
止策等	・海小烈父揆品建度・タービン建居・原子仲建居等	工事中    空 マ	(H24年3月完了)	


注)黒字:平成24年3月28日までに公表した対策 赤字:その後新たに追加した対策 ニュニ・工事中/手配中, ニュニ・完了, 「・・」:付帯工事

1:予備電動機の配備に伴い、浸水した電動機の洗浄・乾燥用資機材(平成23年3月配備完了)を対策から削除。


2:水素排出設備は、天井部排出を止め、水素排出効果が大きいブローアウトパネル開放による排出方式のみとした。開放機材の設置に伴い、穴空け資機材(平成23年6月設置完了)を対策から削除。

(備考)高圧電源車を1台追加配備(計6台)(4月)

#### 志賀原子力発電所における安全強化策の概要(更なる対策)

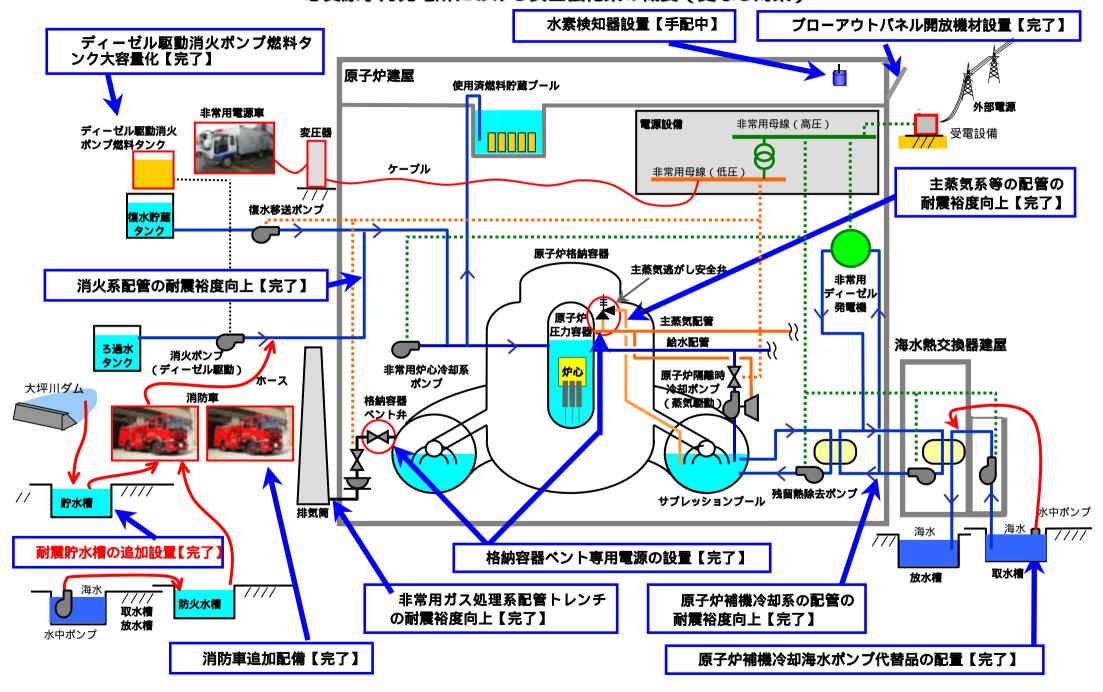

#### 志賀原子力発電所における安全強化策の概要(更なる対策)

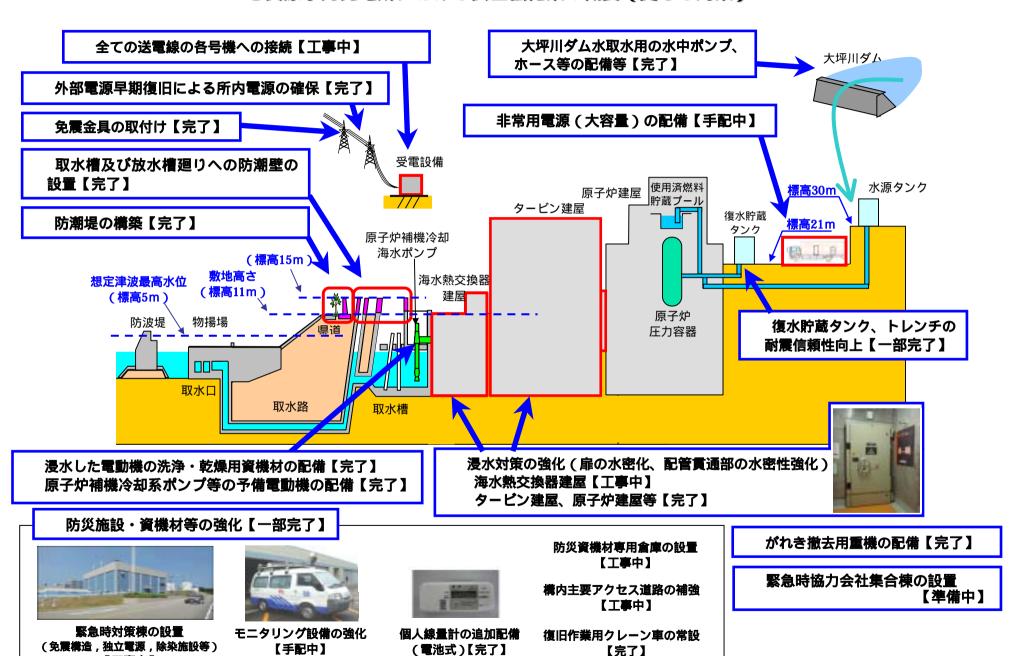

【工事中】
