

志賀原子力発電所2号機 低圧タービン追加点検結果について

平成18年9月8日
北陸電力株式会社


当社は、8月9日から志賀原子力発電所2号機（改良型沸騰水型、定格電気出力135万8千キロワット）の低圧タービンCの高圧タービン側第12段以外の羽根および車軸について、自主的に追加点検を実施しておりましたが、点検の結果、ひび割れ等の異常はありませんでした。

今後、引き続き徹底した原因究明を行い、万全な対策を講じてまいります。

以 上

添付資料 低圧タービンの追加点検結果

低圧タービンの追加点検結果

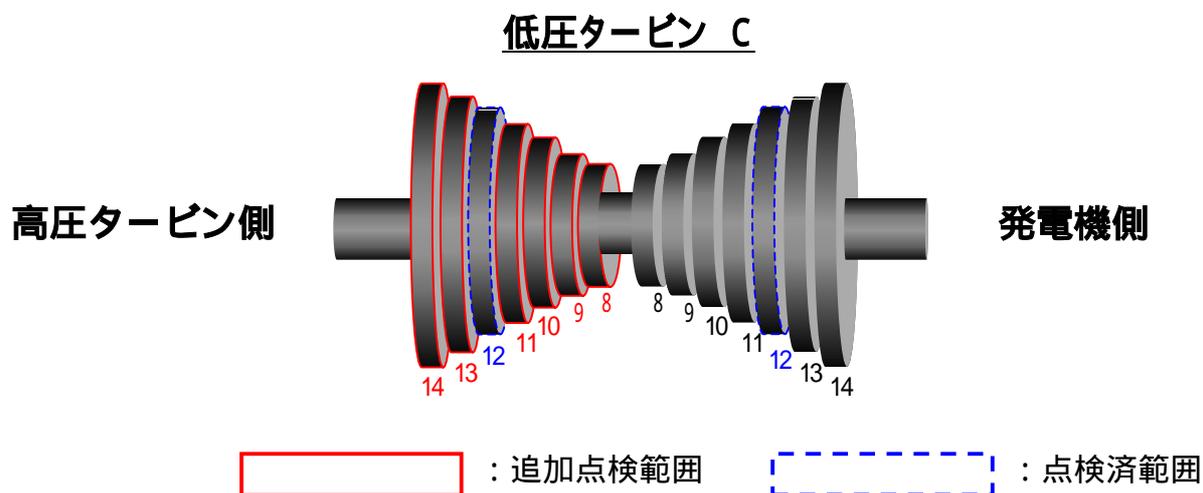

低圧タービン C (高圧タービン側)の点検結果

段落	羽根の枚数	点検結果	
		羽根	車軸
第 8 段	2 1 2 枚	異常なし	異常なし
第 9 段	1 8 0 枚	異常なし	異常なし
第 1 0 段	1 4 0 枚	異常なし	異常なし
第 1 1 段	1 1 2 枚	異常なし	異常なし
第 1 3 段	1 6 0 枚	異常なし	異常なし
第 1 4 段	1 2 2 枚	異常なし	異常なし
